



Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada- Government

Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister

*Sekretariati Koordinues I Qeverise- Kordinacioni Sekretariat Vlade- Government Coordination
Secretariat*

RAPORTI I VITIT 2019 PËR ZBATIM TË REFORMËS SË
ADMINISTRATËS PUBLIKE: STRATEGJIA PËR RREGULLIM
MË TË MIRË 2.0 PËR KOSOVËN (2017-2021)


PRILL 2020

Përmbledhje ekzekutive

Siç është ilustruar në tabelën më poshtë, Strategjia për Rregullim më të mirë 2.0 për Kosovën përfshin dy Objektiva të Përgjithshme të Politikave të cilat ndahen në shtatë Objektiva Specifike të Politikave. Katër objektiva specifike që rrjedhin nga objektivi i parë i përgjithshëm kanë 12 aktivitete, ndërsa tre objektivat specifike të objektivit të dytë të përgjithshëm kanë 6 aktivitete që çojnë në gjithsejtë 18 aktivitete të planifikuara për periudhën 2017-2021. Këto aktivitete janë të ndara në gjithsejtë 116 tregues, nga të cilët 38 ishin planifikuar për periudhën Janar-Dhjetor 2019.


Objektivat e përgjithshme	Nën-objektivi / Objektivi Specifik
Sistemi rregullativ lehtësues	1. Reformat e legjislacionit ekzistues primar dhe sekondar për të rritur konkurrueshmërin; 2. Paraqitja e vlerësimit të ndikimit; 3. Përmirësimi i të dhënave/statistikave; 4. Vlerësimi.
Komunikimi efikas publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara	5. Përmirësimi i komunikimit të politikave 6. Përmirësimi i konsultimit; 7. Përmirësimi i planifikimit të punës.

Shkalla e zbatimit të SRrMM- 2019

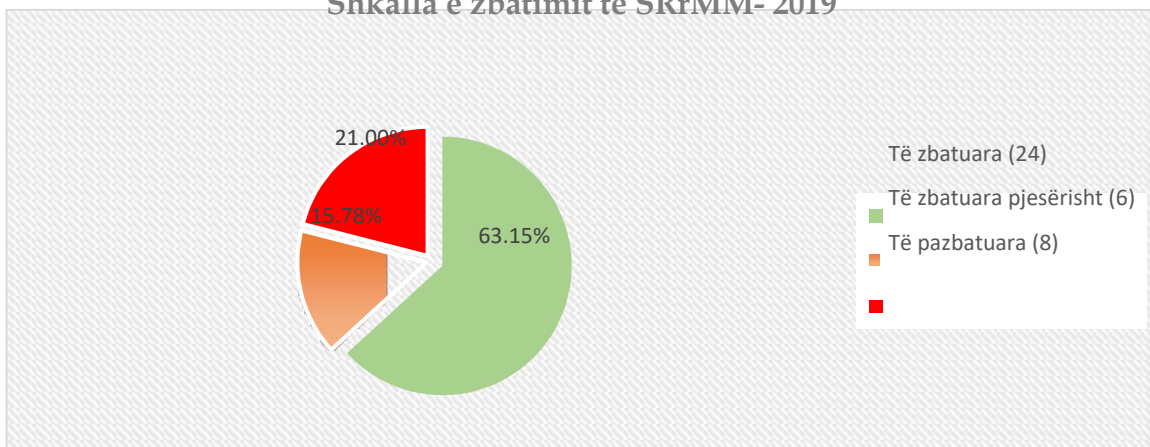



Në këtë drejtim, shkalla e zbatimit të veprimeve të reformës për vitin 2019 qëndron si në vijim:

Objektivi i përgjithshëm I: Sistemi rregullativ lehtësues

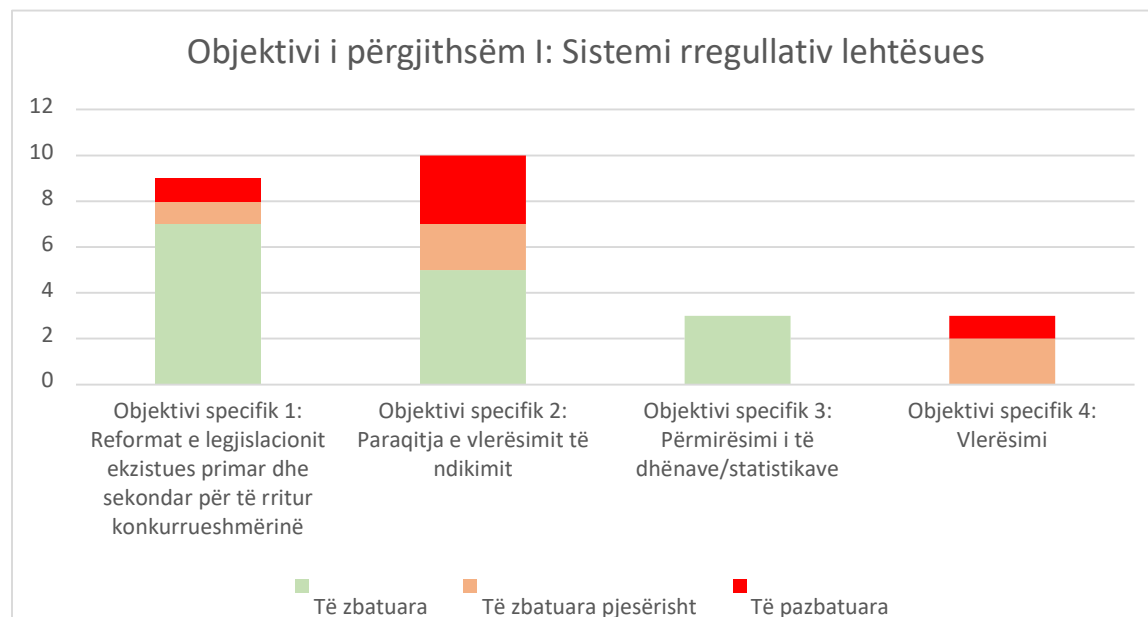

Objektivi i Përgjithshëm II: Komunikimi efikas publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara

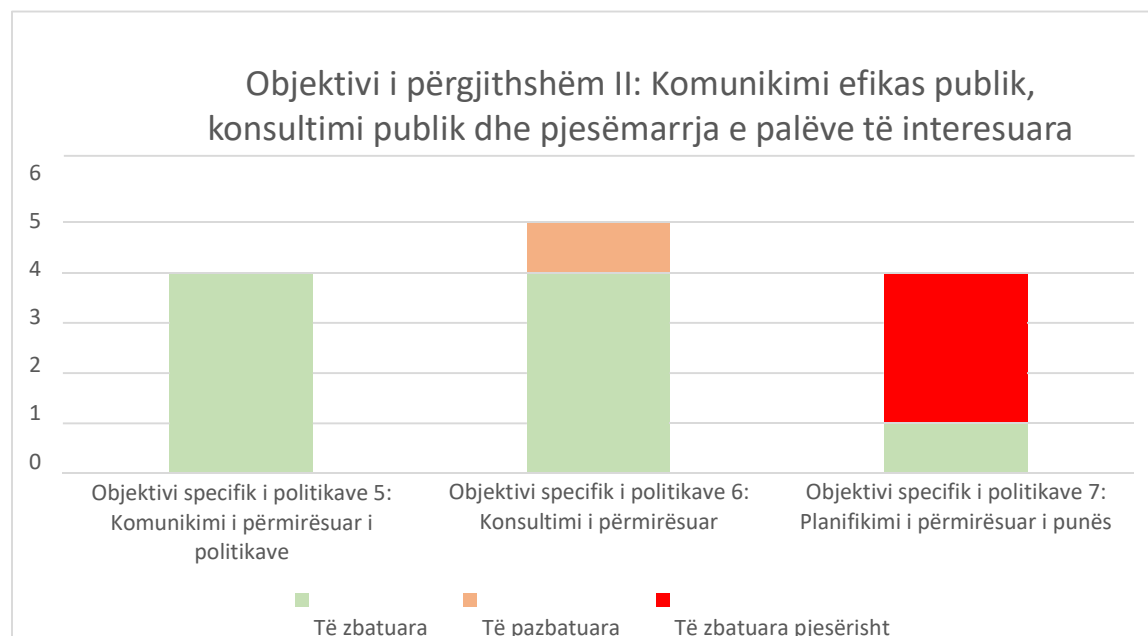

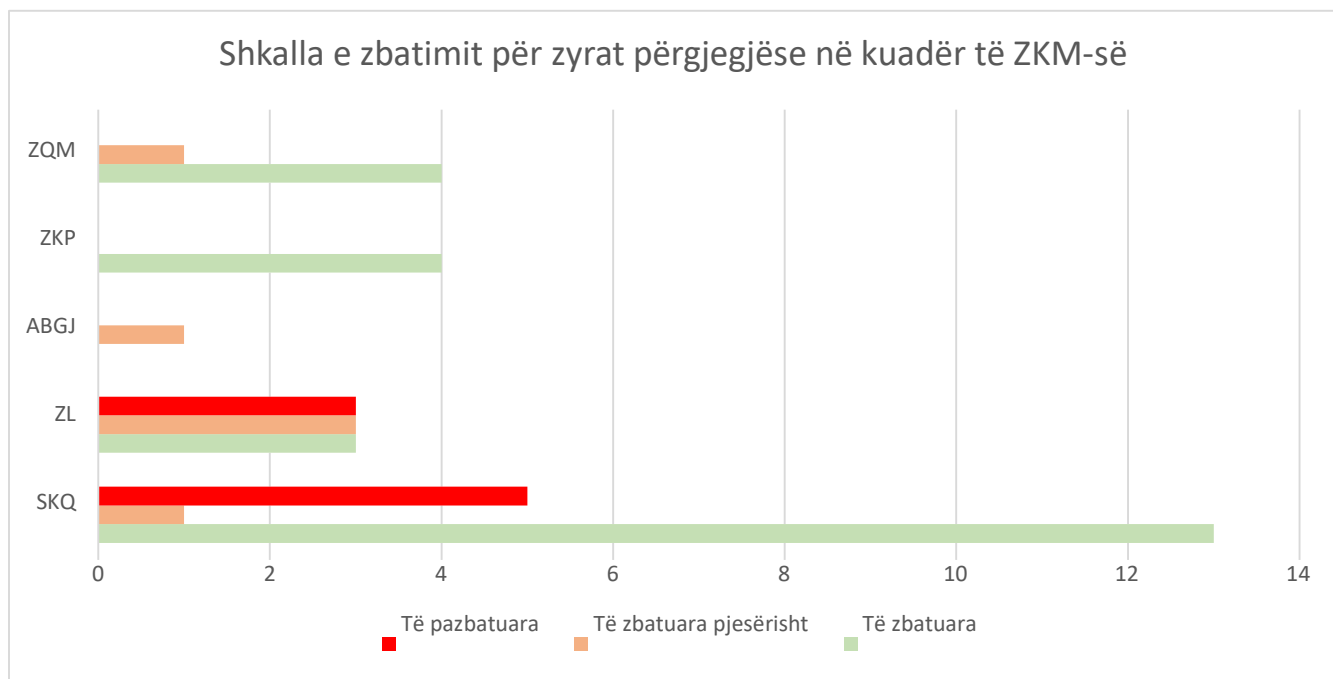

Ekzistojnë disa histori kyçe të suksesit që ia vlen të përmenden për periudhën janar-dhjetor të vitit 2019. Prezantimi i Vlerësimit të Ndikimit dhe zbatimi i saj nga secila ministri shihet si një nga sukseset më të rëndësishme të kësaj strategjie. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2019, Sekretariati Koordinues i Qeverisë (në vijim SKQ) me mbështetjen e Projektit për Mbështetjen e Zhvillimit të Politikave në Zyrën e Kryeministrit (në vijim Projekti SIDA), ka prodhuar një skenë të suksesshme për objektivat e trajnimit. Për të gjitha 26 koncept dokumentet e reja të planifikuara për vitin 2019 janë mbajtur trajnime gjatë gjysmës së parë të vitit 2019. Kjo rezultoi në trajnimin e 118 nëpunësve civilë. SKQ ka shënuar një tjetër sukses në organizatat e saja të trajnimit duke zhvilluar 5 trajnime shitesë të përgjithshme për nëpunësit civilë që nuk janë zyrtarisht pjesë e grupeve të punës për koncept dokumente. Është e rëndësishme të theksohet se stafi i SKQ-së ka marrë përsipër trajnimet nga ekipi i Projektit dhe kjo perceptohet si një arritje e rëndësishme për zhvillimin e kapaciteteve të stafit. Në këtë drejtim janë trajnuar 160 nëpunës civilë. Ndërsa objektivi për vitin 2019 ishte të arrihej shkalla prej 50% e stafit të trajnuar, SKQ ka arritur të përmbushë plotësisht objektivin dhe ka arritur një shkallë të zbatimit prej 93%, dhe ka trajnuar 509 nga 545 personel përkatës të institucioneve për Vlerësimin e Ndikimit.

Një tjetër sukses i rëndësishëm i kësaj periudhe është prezantimi i Modelit të Kostimit Standard (në vijim MKS) në procesin e hartimit të politikave. MKS është një mjet që fuqizon zhvillimin e politikave duke u përqendruar në aktivitetet më të rëndësishme të kompanive se si ata drejojnë, investojnë dhe krijojnë vende pune. Ky model tregon nëse, nga këndvështrimi i këtyre kompanive, zbatohet legjislacioni në mënyrë efikase. Dhe nëse nuk del të jetë kështu, modeli siguron informacione që nevojitet për të përmirësuar legjislacionin dhe zbatimin e tij. Si rezultat, Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë përsipër një detyrim ndërkombëtar për të

zvogëluar barrën administrative (licencat dhe lejet) të përcaktuara në treguesin 5 të Mbështetjes buxhetore sektoriale në bazë të Marrëveshjes Financiare me Bashkimin Evropian në kuadër të IPA 2016. Duke marrë parasysh që Zyra Ligjore është në avantazh për arritjen e treguesit 5.3 (shkallen e uljes prej 10%), në koordinim me IFC-në ka hartuar tre raporte për licencat dhe lejet për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural që duhet të adresohen deri në fund të vitit 2020. Për të zvogëluar barrën administrative, MKS duhet të aplikohet si një metodologji për të thjeshtuar procedurat. Projekti SIDA në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Kosovës për Administratë Publike (në vijim IKAP) dhe Zyrën Ligjore ka organizuar (6) gjashtë trajnime ku janë trajnuar 55 nëpunës civilë. Trajnimet janë përbërë nga pjesa teorike duke shpjeguar përkufizimet, detyrimin e informacionit, kërkesën e të dhënave, aktivitetet administrative dhe koston e rregullimit. Ndërsa janë organizuar edhe ushtrime praktike - ku pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të punojnë brenda grupeve të punës dhe të aplikojnë Modelin e Kostimit Standard për ligje specifike të zgjedhura për qëllimin e ushtrimeve.

Një sukses i fundit që duhet përmendur mbështetet në përmirësimin e komunikimit të politikave që ka rritur si kapacitetet e nëpunësve civilë ashtu edhe përfshirjen e palëve të interesuara në procesin e hartimit të politikave. Zyra për Komunikim me Publikun (në vijim ZKP) në Zyrën e Kryeministrit (në vijim ZKM) ka organizuar 6 trajnime mbi Udhëzimet për Komunikim me Media dhe 6 trajnime të tjera për Komunikimin e Politikave për nëpunësit civilë në Qeverinë qendrore, dhe kanë përfunduar hartimin e një Udhëzuesi për politikën e qeverisë për komunikim. Plani për ngritjen e kapaciteteve për ZKP-në, në ZKM, është aprovuar së bashku me buxhetin shtesë në kuadër të aprovimit të Rregullores së re për Shërbimet e Komunikimit të Qeverisë. Kjo rregullore u shton funksione dhe përgjegjësi zyrave të komunikimit në lidhje me komunikimin e politikave dhe për zbatimin e saj kërkohet ngritje e kapaciteteve të ZKP-së-ZKM-së.

Përmbledhje e përgjithshme

Strategjia për rregullim më të mirë 2.0 për Kosovën është pjesë e Strategjive të Reformës në Administratën Publike të Kosovës, dhe Sekretariati Koordinues i Qeverisë në Zyrën e Kryeministrit është zyra e vetme përgjegjëse për monitorimin dhe raportimin e kësaj strategjie. Që nga viti 2017, SKQ ka zhvilluar dy periudha raportimi, kryesisht raportime gjashtëmujore dhe raportime vjetore. Para përfundimit të raportit vjetor të vitit 2020 për Strategjinë, SKQ ka analizuar zbatimin e aktiviteteve të 6 muajve të parë (janar-qershor), ku ka identifikuar sfidat kryesore dhe u ka dhënë rekomandimet e nevojshme zyrave dhe agjencive përgjegjëse për zbatim, duke hapur kështu rrugën për një analizë më të mirë dhe shkallë më të lartë të zbatimit në fund të vitit.

Ekzistojnë dy grupime kryesore të strategjisë të cilat janë të rëndësishme sa i përket zbatimit të përgjithshëm të reformës së administratës publike në vend. Së pari vijnë aktivitetet për përmirësimin e sistemit rregullator në Kosovë, me qëllim të promovimit të rritjes gjithëpërfshirëse ekonomike. Në këtë aspekt, e rëndësishme është të përmendet që SKQ ka

arritur të forcojë më tej sistemin e koncept dokumenteve me anë të përdorimit të disa mjeteve analitike si: MKS, Testi i NVM-ve, Vlerësimi i Ndikimit Gjinator, Vlerësimi i Ndikimit tek të Rinjtë, Analiza e Barazisë Sociale në sistemin e vlerësimit të ndikimit i cili tani pranohet nga çdo ministri në vend, dhe nga nëpunësit civilë. Diçka e tillë tregon ndryshim në procesin e hartimit të politikave në Kosovë, me ç'rast numri më i madh i analizave, cilësia më e mirë dhe strategjitë e duhura të zbatimit do të çojnë në politika më të mira dhe në këtë mënyrë në rritje ekonomike të zgjeruar në Kosovë.

SKQ, në miratimin e Koncept Dokumentit për zvogëlimin e barrës administrative, që paraqet një nga aktivitetet kyçe të Strategjisë, ka arritur të zhvillojë dokumentin elektronik duke përdorur të gjitha mjetet përkatëse të prezantuara në Manualin për Hartimin e Koncept Dokumenteve, duke rritur kështu cilësinë e analizës dhe duke e bërë atë shembull të mirë të politikave të bazuara në prova për ministrinë e linjës. SKQ gjithashtu ka arritur të përfshijë të gjithë aktet përkatës gjatë procesit të hartimit. SKQ ka përfshirë aktet në procesin e hartimit të Koncept Dokumentit për Zvogëlimin e Barrës Administrative, me theks të veçantë në komunitetin e biznesit që preket vazhdimisht nga procedurat e burokracisë të vendosura nga institucionet publike. Për më tepër, SKQ është konsultuar me gjashtë komuna që përballen me barra administrative që vijnë nga niveli qendror. Të gjitha takimet ishin të natyrës konsultative, me ç'rast të gjitha palët siç janë bizneset, komunat dhe agjencitë e ndryshme kanë treguar pengesat me të cilat përballen në punën e tyre të përditshme si pasojë e procedurave burokratike. Diskutimet me të gjithë aktet kanë ndihmuar veçanërisht grupin punues dhe SKQ-në në përcaktimin e problemit, në identifikimin e shkaqeve dhe efekteve, vendosjen e objektivave dhe zhvillimin e mundësive të përshtatshme për të adresuar uljen e barrës administrative. Duke marrë parasysh kompleksitetin e programit, SKQ ka vendosur të publikojë në platformën online për konsultim publik, Koncept Dokumentin për Programin e Zvogëlimin të Barrës Administrative për periudhën një mujore, dhe gjithashtu ka organizuar takime specifike deri sa dokumenti është botuar në platformë. Siç është përmendur në këtë raport, Qeveria në shkurt të vitit 2020 ka miratuar Koncept Dokumentin.

Grupimi i dytë bazohet në angazhimin e akterëve. Dihet mirë që përfshirja e akterëve të rëndësishëm në procesin e hartimit të politikave jo vetëm që rrit transparencën dhe përgjegjshmërinë, por gjithashtu ndihmon politikë-bërësit të gjejnë zgjidhje më të mira për problemet që ata nuk do t'i vërenin. Në këtë drejtim, Zyra e Komunikimit Publik dhe Zyra për Qeverisje të Mirë (në vijim ZQM) në Zyrën e Kryeministrit kanë treguar angazhime të forta dhe kanë rritur trajnimet për një numër të madh të zyrtarëve të komunikimit në të gjithë qeverinë dhe ministrinë e linjës dhe kanë trajnuar ata mbi përfshirjen e akterëve në sistemin e hartimit të politikave. Gjithashtu, është e rëndësishme të përmendet fakti që me synimet e përcaktuara në Strategjinë për Rregullim më të Mirë, takimet publike janë rritur dhe qeveria ka arritur të arrijë objektivat e përcaktuara për komunikimin publik të strategjive, ligjeve, akteve nënligjore dhe koncept dokumenteve në platformën online. Gjatë vitit 2019 janë konsultuar 100% (274 prej 274) të dokumenteve të nxjerra nga Ministrinë e linjës bazuar në Standardet minimale për Konsultime - të cilat përfshijnë konsultimin e 15 koncept dokumenteve, 31 akteve nënligjore, 77 rregulloreve, 129 udhëzimeve administrative, 6 strategjive, 5 programeve, 7 planeve të veprimit dhe 8 dokumenteve të tjera. Pavarësisht se janë publikuar në platformën online për konsultime,

ZQM ka vlerësuar se 37% e dokumenteve janë konsultuar me akterët gjatë punëtorive, 36% janë konsultuar me postë elektronike, 12.6% janë konsultuar gjatë takimeve/dëgjimeve publike, 8.6% nga takimet kolegjale dhe 7.6% gjatë takimeve me akterët kryesorë. E gjithë kjo tregon angazhimin e fortë të qeverisë në përmirësimin e procesit të përfshirjes së akterëve dhe qytetarëve në procesin e hartimit të politikave.

Grumbullimi i të dhënave për këtë raport ka filluar nga muaji dhjetor i vitit 2019, ku SKQ i ka dërguar dokumentin Excel që përmban indikatorët në secilën zyrë të lidhur për informacione mbi zbatimin. Dokumenti u përfundua nga mesi i shkurtit me të gjitha të dhënat përkatëse të grumbulluara. Hartimi i raportit filloi pas kësaj periudhe. Është e rëndësishme të përmendet fakti që nuk ka mekanizma specifike të menaxhimit dhe të koordinimit, për faktin se Strategjia ka të bëjë me zyrat brenda Zyrës së Kryeministrit dhe asnjë institucion tjetër.

Ka disa sfida të rëndësishme që duhet të përmenden në këtë drejtim. Për shkak të krizës ekzistuese COVID-19 në botë, (*masat e marra nga Qeveria për të kufizuar takimet publike, tryezat e rrumbullakëta, seancat dëgjimore publike, etj.*), trajnimet në të gjitha fushat siç është planifikuar në Strategji do të vonohen. Kjo mund të ketë ndikim negativ në arritjen e objektivave dhe aktiviteteve specifike të parashikuara në SRrM. Ndërsa nga ana tjetër, është e rëndësishme të përmendet që bashkëpunimi i fortë me SIGMA është i domosdoshëm në procesin e përditësimit të Rregullores së Punës së Qeverisë, i cili duhej të përfundonte deri në fund të vitit 2019, por po përballlet me vonesa serioze. Sfidat e mëtejshme janë shpjeguar në nën-titullin për Sfidat dhe Hapat e ardhshëm në raport.

Bazuar në rekomandimet e dhëna gjatë periudhës raportuese gjashtëmujore të Strategjisë, SKQ ka rritur bashkëpunimin me zyrat e tjera të ndërlidhura në ZKM, dhe ka arritur të plotësojë Planin Vjetor të Punës dhe Planin Indikativ të Punës për periudhën 2020-2022. Në këtë sistem të ri të planifikimit, SKQ ka prezantuar tregues të procesit, të cilat do të përdoren gjatë vlerësimit të secilit aktivitet të ministrive të linjës nga ana e SKQ dhe në matjen e treguesve dhe rezultateve - duke rritur kështu planifikimin e bazuar në rezultate për ministrinë e linjës.

Tabela 1: Karta e raportit të treguesit në nivel të rezultatit

KARTA E RAPORTIT TË TREGUESVE NË NIVEL TË REZULTATIT			
Baza	Treguesi/objektivi për vitin 2018	Statusi gjatë periudhës së raportimit	shënim
Objektivi i përgjithshëm 1 - Sistemi Rregullativ Lehtësues			
Objektivi specifik 1.1: Reformat e legjislacionit ekzistues primar dhe sekondar për të rritur konkurrueshmërinë			
Treguesi 1.1.1 Miratimi i Koncept Dokumentit për programin e zvogëlimit të barrës administrative			
Nuk ekziston ndonjë dizajn i një programi efektiv për zvogëlimin e barrës administrative	Koncept Dokumenti është duke u hartuar	Koncept Dokumenti për ZBA i përfunduar.	Nuk është miratuar në vitin 2019 sepse Qeveria në dorëheqje nuk ka mbajtur takime në të cilat do të miratonte politika të ngjashme. Sidoqoftë, koncept dokumenti është miratuar në shkurt të vitit 2020

<i>Treguesi 1.1.2 Zhvillimi i kapaciteteve të MKS</i>			
Nuk ekziston asnjë trajnim për MKS	20% e personelit përkatës në ZKM dhe ministritë e linjës janë trajnuar	20% e personelit përkatës tashmë të trajnuar	Objektivi i vitit 2018 është arritur gjatë vitit 2019 për shkak të certifikimit të fundit për trajnerët për MKS.
<i>Treguesi 1.1.3 Rritja e kapaciteteve të trajnimit për aplikimin e Modelit të Kostimit Standard</i>			
0	5	14	Programi i Trajnimit të Trajnerëve për Modelin e Kostimit Standard ka filluar në vitin 2018. TiT ka përfunduar gjatë gjysmës së parë të vitit 2019 dhe janë certifikuar 14 trajnerë.
<i>Treguesi 1.1.4 Integrimi i MKS në zhvillimin e politikave</i>			
MKS nuk është pjesë e zhvillimit të politikave	MKS-së është përfshirë në udhëzimet për zhvillimin e politikave (30% e KD-ve përkatëse përmbajnë pjesën për barrën administrative me matjen e MKS-së)	MKS-së është përfshirë në udhëzimet për zhvillimin e politikave megjithatë aplikimi nuk ka filluar ende. Kështu që ky objektivi nuk përmbushet	Kjo do të futet në listën e re të Koncept Dokumenteve për vitin 2020 pasi të miratohet Programi Qeveritar
Objektivi specifik 1.2. Paraqitja e Vlerësimit të Ndikimit			
<i>Treguesi 1.2.1 Ngritja e kapaciteteve për zhvillimin e politikave në institucionet e QQ-së dhe në ministritë e linjës</i>			
0	25% e stafit përkatës të QQ-së dhe ministrive të linjës janë trajnuar	50% i objektivit i përmbushur	Numri i personave të trajnuar për hartimin e Koncept Dokumenteve në vitin 2019 është 278 persona. Duke shtuar shumën kumulative, nëpunësit civilë të trajnuar gjithsej janë 509. Kjo është 93% e 545 personave që konsiderohen se janë personeli përkatës i zhvillimit të politikave
<i>Treguesi 1.2.2 Rritja e kapaciteteve të trajnimit për Vlerësimin e Ndikimit</i>			
10	10	10	Vlera fillestare për vitin 2019 nuk nënkupton ndryshim në krahasim me vitin 2016.

			Meqenëse nuk ishte parashikuar ndonjë zhvillim për këtë çështje, ky objektiv vlerësohet të jetë përmbushur.
<i>Treguesi 1.2.3 Përgatitja dhe miratimi i RrP për të zëvendësuar koncept dokumentet me vlerësimin e ndikimit</i>			
Sistemi për hartimin e Koncept Dokumenteve në vend të VN-ve	Ministritë e linjës janë të detyruara të hartojnë Koncept Dokumente bazuar në Udhëzuesit e përditësuar për hartimin e Koncept Dokumenteve.	Objektivi i përmbushur	Me futjen në përdorim të Udhëzuesit dhe Manualit të ri për hartimin e Koncept Dokumenteve, të gjitha ministritë janë të detyruara të kryejnë politika ex-ante bazuar në një bazë më të gjerë dhe të përmirësuar. Objektivi i caktuar pra është përmbushur.
<i>Treguesi 1.2.4 Zhvillimi i politikave do të bëhet më i bazuar në dëshmi dhe VN-ja do të përdoret rregullisht nga ministritë e linjës</i>			
Vlerësimi me 3 për treguesin e SIGMA-s 'Shkalla në të cilën procesi i hartimit të politikave përdor më së miri mjetet analitike'	3	3	Vlera fillestare për vitin 2018 nuk nënkupton ndryshim në krahasim me vitin 2016. SIGMA ka kryer një vlerësim të mëtutjeshëm në vitin 2017. Meqenëse metodologjia ishte rregulluar, rezultati për Kosovën ishte reduktuar në 2. Sidoqoftë, pasi që nuk ka pasur rregullime aktuale, rezultati i bazuar në metodologjinë origjinale mbetet 3 (siç paraqitet në raportin e SIGMA-s për Kosovën, faqe 24). Meqenëse nuk ishte parashikuar ndonjë zhvillim në lidhje me këtë çështje, ky objektiv vlerësohet si i përmbushur.
Objektivi specifik 1.3: Përmirësimi i të dhënave/statistikave			
<i>Treguesi 1.3.1: Janë në dispozicion të dhënat e standardizuara për llogaritjet e MKS-së</i>			
Nuk ekzistojnë të dhëna të standardizuara për MKS	Të dhënat e standardizuara të MKS-së janë plotësisht në dispozicion	Të dhënat e standardizuara të MKS-së janë plotësisht në dispozicion	Manuali i MKS është miratuar në vitin 2018, së bashku me vlerat e standardizuara të matjeve. Objektivi i caktuar pra është përmbushur.
<i>Treguesi 1.3.2 Baza e të dhënave të VN-së është duke u krijuar</i>			
Nuk ekziston ndonjë bazë e	Plani për bazën e të dhënave të VN-	Baza e të dhënave të VN-	Baza e të dhënave të VN-së është krijuar dhe miratuar, dhe

të dhënave për VN	së është gati	së është përfunduar	publikohet në faqen e internetit të ZKM-së
Objektivi specifik 1.4: Vlerësimi			
<i>Treguesi 1.4.1: Vlerësimet bëhen çdo vit</i>			
Asnjë vlerësim i përfunduar dhe miratuar	8 vlerësime (duke shtuar numrat 2017 dhe 2018)	4 vlerësime të përfunduara në 2018 dhe 2 vlerësime në 2019	
<i>Treguesi 1.4.2 Rritja e kapaciteteve të trajnimit për vlerësimin</i>			
0	59	20	ZL, e mbështetur nga IFC, ka organizuar 1 TiT gjatë gjysmës së parë të 2019. Megjithatë, kjo nuk ka bërë që objektivi i caktuar të përmbushet.
<i>Treguesi 1.4.3 Përmirësimi i kapaciteteve për vlerësim në institucionet e QQ dhe në ministrinë e linjës</i>			
0	Trajnimi i stafit përkatës për vlerësimin legjislativ ka filluar, janë trajnuar të paktën 10% e stafit përkatës në çdo ministri të linjës dhe në çdo institucion përkatës të QQ-së)	Objektivi i përmbushur	Trajnimi i stafit përkatës për vlerësimin legjislativ ka filluar, janë trajnuar të paktën 10% e stafit përkatës në çdo ministri të linjës dhe në çdo institucion përkatës të QQ-së)
<i>Treguesi 1.4.4: Është krijuar procesi për të përdorur gjetjet e vlerësimit në përmirësimin e legjislacionit aktual</i>			
0%	40%	Nuk është në dispozicion	ZL nuk ka siguruar të dhëna përkatëse për përdorimin e vlerësimit në legjislacionin ekzistues. Sidoqoftë, është e rëndësishme të përmendet që ato janë në fazën përfundimtare të hartimit të Manualit për Vlerësimin ex-post

KARTA E RAPORTIT TË TREGUESVE NË NIVEL TË REZULTATIT			
Baza	Treguesi/objektivi për vitin 2018	Statusi gjatë periudhës së raportimit	shënim
Objektivi i përgjithshëm 2 – Komunikimi efikas publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesura			
Objektivi specifik 2.1: Përmirësimi i komunikimit të politikave			
<i>Treguesi 2.1.1 Është hartuar plani i veprimit për përmirësimin e komunikimit të politikave</i>			
Nuk ka plan veprimi për të përmirësuar komunikimin e politikave	Është hartuar plani i veprimit për komunikimin e politikave	Objektivi i caktuar është përmbushur	Plani i veprimit për komunikimin e politikave është zhvilluar si pjesë e KD mbi Shërbimin e Komunikimit Qeveritar.
<i>Treguesi 2.1.2 Rritja e kapaciteteve të trajnimit për Komunikimin e Politikave</i>			
0	5	5	Gjithsej 22 persona janë certifikuar si trajnerë për Komunikimin e Politikave.
<i>Treguesi 2.1.3 Zhvillimi i kapaciteteve për komunikimin e politikave</i>			
Stafi nuk është i trajnuar	50% e stafit përkatës të komunikimit në QQ dhe ministritë e linjës janë trajnuar	50% e përmbushur.	Objektivi i caktuar është përmbushur përmes organizimit të trajnimeve 3-ditore mbi hartimin e Koncept Dokumenteve.


<i>Treguesi 2.1.4 Komunikimi i politikave i integruar në hartimin e politikave</i>			
Komunikimi i politikave nuk është pjesë e Koncept dokumenteve ose Planeve të zbatimit	15% e Koncept Dokumenteve të miratuar përmbajnë referenca të qarta për aktivitetet e komunikimit	Nuk është bërë asnjë vlerësim i qartë nga ZKP (Zyrtari për Komunikim me Publikun).	Zakonisht KD-të i referohen veprimtarive të komunikimit që janë kryer si pjesë e hartimit të KD-së. Sidoqoftë, ky objektivi nuk është vlerësuar dhe konsiderohet se nuk është përmbushur.
Objektivi Specifik 2.2. Konsultimi i përmirësuar			
<i>Treguesi 2.2.1 Rritja e kapaciteteve të stafit për konsultime</i>			
48 pjesëtarë të stafit të trajnuar	Së paku 10% e anëtarëve përkatës të stafit nga secila ministri e linjës dhe të gjithë stafit përkatës të QQ-së janë trajnuar për	66% e objektivit është përmbushur	Numri i personave të trajnuar në Konsultim në vitin 2019 është 35 persona. Kur shton numrin e përgjithshëm të personave të trajnuar gjatë vitit 2018 (167) kjo bëhet 202 persona të trajnuar. Kjo është 66% e 303 personave që konsiderohen të jenë personeli përkatës për hartimin e

	konsultim.		politikave. Prandaj objektivi i caktuar është përmbushur.
<i>Treguesi 2.2.2 Niveli i përputhshmërisë me Standardet minimale për të gjitha vendimet përkatëse të qeverisë</i>			
0%	50%	59%	Treguesi mat nivelin e zbatimit të dispozitave në Rregulloren 05/2016 për Standardet minimale të Konsultimeve Publike për vendimet më të rëndësishme të marra nga qeveria.
<i>Treguesi 2.2.3 Rritja e efektivitetit të konsultimit publik në zhvillimin e politikave dhe legjislacionit</i>			
3 (SIGMA)	4	Nuk është e zbatueshme për vitin 2019.	
Objektivi specifik 2.3: Planifikimi i përmirësuar i punës			
<i>Treguesi 2.3.1 Hartoni dhe miratoni KD në PISHP</i>			
0	Koncept dokumenti i miratuar	Objektivi i synuar është përmbushur.	Koncept dokumenti i miratuar dhe publikuar.
<i>Treguesi 2.3.2 Hartoni PISHP</i>			
Asnjë PISHP nuk ekziston	PISHP është në zhvillim në përputhje me vendimin e miratuar në Koncept Dokumentin për PISHP.	Udhëzuesi dhe Manuali mbi PISHP është miratuar dhe SKQ ka filluar hartimin e planit vjetor të punës bazuar në atë.	Sidoqoftë, objektivi i caktuar për vitin 2019 nuk është përmbushur për shkak të vonësës së Programit Qeveritar.
<i>Treguesi 2.3.3 Rritja e cilësisë së planifikimit të punës së Qeverisë</i>			
68%	75%	44%	Shkalla e zbatimit të PVPQ-së për vitin 2019 është më e ulët se sa pritej të ishte, kjo për shkak të takimeve më të pakta qeveritare të mbajtura nga qeveria në dorëheqje për miratimin e dokumenteve dhe më pak vullnet politik për të çuar përpara agjendat.

Sistemi rregullativ lehtësues

Kjo strategji bazohet në angazhimin e fortë për të promovuar rritjen gjithëpërfshirëse ekonomike. Krijimi dhe zbatimi i praktikave për legjislacionin ekzistues mund të ndikojë negativisht në përpjekjet e sektorit privat për të përmirësuar konkurrencën dhe si rrjedhojë të pengojë rritjen ekonomike. Këto kosto ekonomike rrjedhin nga joefikasitetet që mund të jenë thelbësore. Ndërsa ndryshojnë kushtet e tregut dhe mundësitë teknologjike, dispozitat legjislative që mund të kenë pasur kuptim në një fazë të hershme mund të fillojnë të vendosin kufizime për bizneset dhe të ndikojnë negativisht në konkurrencën pasi ato nuk janë në hap me zhvillimet e fundit. Duhet të vihet theksi në sigurimin që zgjidhjet legjislative të zbatohen siç duhet në praktikë. Legjislacioni i zbatuar në mënyrë jo të duhur mund të çojë në vështirësi në fushat kryesore të qeverisë përfshirë përgjegjësinë e qeverisë, transparencën, luftimin e korrupsionit dhe mbikëqyrjen e qytetarëve. Në këtë drejtim, objektivi i parë i përgjithshëm synon të përmirësojë cilësinë e legjislacionit dhe të sigurojë që legjislacioni të shërbejë për zhvillimin e vendit.

1.1 Objektivi specifik 1: Reformat e legjislacionit ekzistues primar dhe sekondar për të rritur konkurrueshmërinë

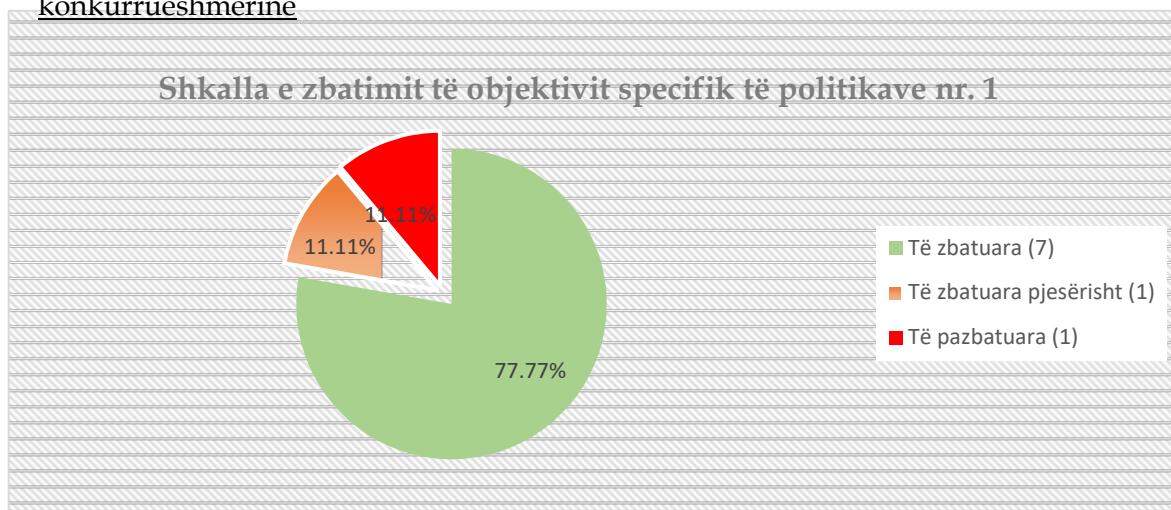


Ky objektivi përmban gjithsej 3 aktivitete dhe 23 tregues që janë planifikuar për zbatim deri në fund të vitit 2021. Nga 23 tregues 9 janë planifikuar për vitin 2019. 7 nga aktivitetet e planifikuara, ose 77.77%, janë zbatuar gjatë periudhës janar-dhjetor 2019.

Është e rëndësishme të përmendet që Koncept Dokumenti për Zvogëlimin e Barrës Administrative ka kaluar nëpër të gjithë hapat e nevojshëm drejt miratimit, megjithëse për shkak të dorëheqjes së qeverisë nuk ka qenë e mundur të miratohet në mbledhjen e Qeverisë deri në fund të vitit 2019. Sidoqoftë, dokumenti u miratua nga Qeveria në shkurt të vitit 2020. Përveç kësaj, SKQ, ZL dhe Projekti SIDA kanë arritur të organizojnë 6 trajnime me ministrinë e linjës për aplikimin e Modelit të Kostimit Standard nga trajnerët e certifikuar në këtë temë. ZL dhe KNF/Banka Botërore kanë përmbyllur gjithashtu raportin për thjeshtimin, bashkimin ose revokimin e licencave dhe lejeve për tri ministri (MMPH, MTI, MBPZHR), dhe e kanë

bashkëngjitur raportin në Koncept Dokumentin për Zvogëlimin e Barrës Administrative. Gjithashtu, projektligjet dhe aktet nënligjore të identifikuara në raportet e thjeshtësimit do të jenë pjesë e programit legjislativ të vitit 2020, si dhe pjesë e planit të akteve nënligjore të vitit 2020.


1.2 Objektivi specifik 2: Zbatimi i vlerësimit të ndikimit

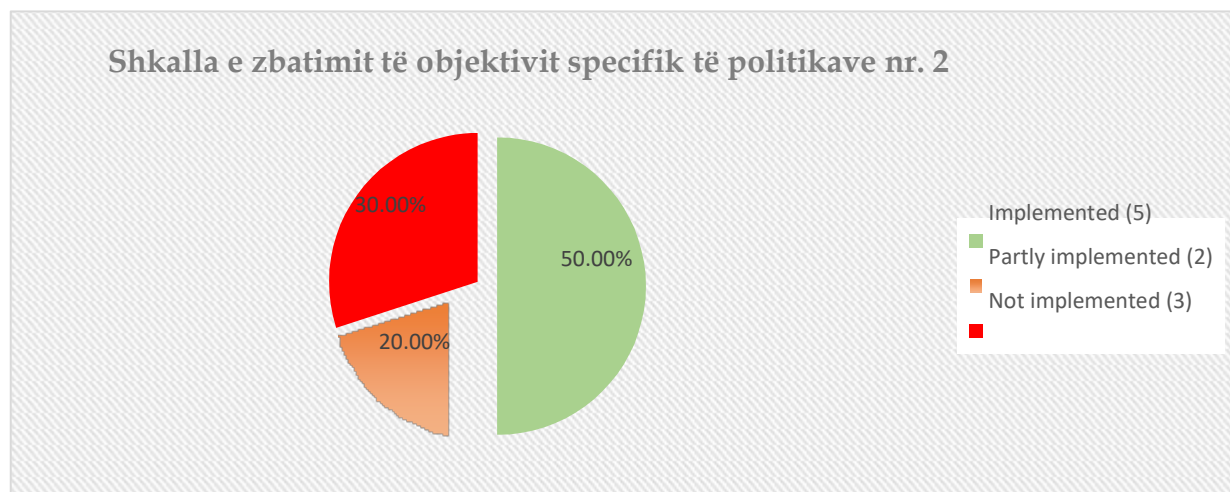

Ky objektivi përmban gjithsej 5 aktivitete dhe 38 tregues të planifikuar për zbatim deri në fund të vitit 2021. Nga këta 38 tregues, 10 janë planifikuar për vitin 2019. 5 nga aktivitetet e planifikuara, ose 50% janë zbatuar gjatë periudhës janar-dhjetor 2019.

Një nga arritjet kryesore të këtij objektivi specifik të politikave mbështetet në trajnimin e nëpunësve civilë për hartimin e vlerësimeve të ndikimit në bazë të Doracakut/Udhëzuesit të ri për hartimin e koncept dokumenteve. Gjatë vitit 2019, SKQ ka arritur të trajnojë 93% (ose 509) të nëpunësve civilë përkatës, duke tejkaluar kështu cakun prej 50% për vitin 2019.

1.3 Objektivi specifik 3: Përmirësimi i të dhënave/statistikave mbi hartimin e politikave

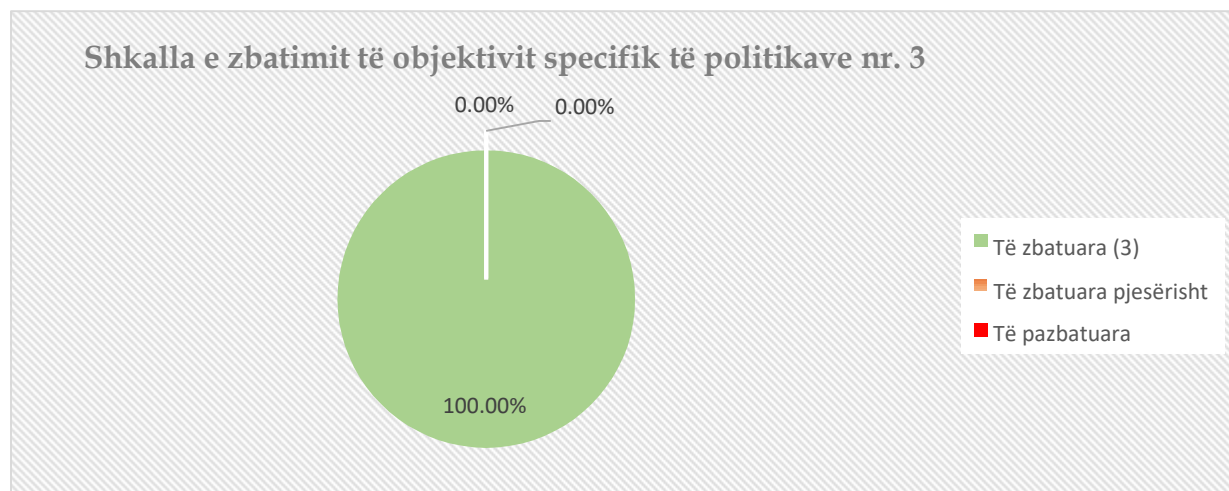

Ky objektiv përmban gjithsej 1 aktivitet dhe 7 tregues që janë planifikuar të zbatohen deri në fund të vitit 2021. Nga 7 treguesit, 3 janë planifikuar për vitin 2019. Të tre (3) treguesit janë zbatuar gjatë periudhës janar-dhjetor 2019.

SKQ ka arritur të krijojë një bazë të dhënash për vlerësimin e ndikimit, e cila do të përdoret gjatë përpilimit të vlerësimeve të ndikimit nga ministritë e linjës. Baza e të dhënave ka kaluar nëpër të gjitha proceset e nevojshme të konsultimit të kërkuara nga Standardet minimale për komunikimin e politikave dhe së shpejti do të publikohet në faqen e internetit të Zyrës së Kryeministrit.

1.4 Objektivi specifik 4: Vlerësimi



Ky objektiv përfshin 3 aktivitete dhe 7 tregues që janë planifikuar për zbatim deri në fund të vitit 2021. Nga 7 treguesit, 3 janë planifikuar për vitin 2019. 2 nga treguesit e planifikuar janë zbatuar pjesërisht dhe nuk ka asnjë tregues që është zbatuar plotësisht gjatë kësaj periudhe.

Ky objektiv specifik përballlet me disa sfida, prandaj nuk ka tregues që janë zbatuar plotësisht. Sidoqoftë, është e rëndësishme të përmendet që ZL së bashku me KNF/Bankën Botërore kanë filluar trajnimin e trajnerëve për vlerësimin ex-post dhe 20 nëpunës civilë pritet të certifikohen gjatë gjysmës së parë të vitit 2020.

Komunikimi efikas publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara

Në mënyrë që publiku dhe palët e interesuara të kenë mundësi të përfshihen në zhvillimin e politikave, Qeveria duhet të sigurojë përmirësimin e mëtejshëm të komunikimit gjatë procesit të zhvillimit të politikave dhe gjatë fazës së zbatimit të tyre. Rëndësia e komunikimit të politikave

është theksuar nga vendimi i Bashkimit Evropian për ta konsideruar komunikimin e politikave si një objektiv strategjik dhe nga të gjitha aktivitetet që rrjedhin nga ky vendim. Komunikimi është esencial për të siguruar informimin e publikut dhe të palëve të interesuara për qëllimet e politikave që qeveria synon të arrijë; që ata të kenë informata në kohë të duhur në lidhje me masat e politikave që Qeveria në fakt synon t'i arrijë; dhe t'u jepen mundësi të mjaftueshme për t'u përgatitur për pjesëmarrje në zhvillimin e strategjive, koncept dokumenteve, propozimeve legislative dhe vendimeve të tjera qeveritare në bazë të një zgjedhjeje të arsyetuar dhe të informuar për ta bërë këtë. Përveç kësaj, pasi qeveria të miratojë politikat dhe legjislacionin, komunikimi efikas duhet të sigurojë që grupet e synuara dhe palët e interesuara të njoftohen për të drejtat e tyre, mundësitë dhe detyrimet. Në këtë aspekt, objektivi i dytë i përgjithshëm synon të përmirësojë procesin e komunikimit të politikave, si gjatë, ashtu edhe pas miratimit të politikave.


2.1 Objektivi specifik 1: Përmirësimi i komunikimit të politikave



Ky objektivi përmban 2 aktivitete dhe 16 tregues të planifikuar për zbatim deri në fund të vitit 2021. Nga 16 tregues, 4 ishin planifikuar për vitin 2019. Të gjithë këta 4 tregues janë zbatuar plotësisht gjatë periudhës janar-dhjetor 2019.

Zyra për Komunikim me Publikun ka arritur t'i zbatojë të gjitha aktivitetet e planifikuara gjatë vitit 2019, duke organizuar kështu 6 trajnime lidhur me Komunikimin me Media, 6 trajnime lidhur me Komunikimin e Politikave dhe hartimin e Manualit për Komunikimin e Qeverisë me Publikun.

2.2 Objektivi specifik 2: Përmirësimi i konsultimeve

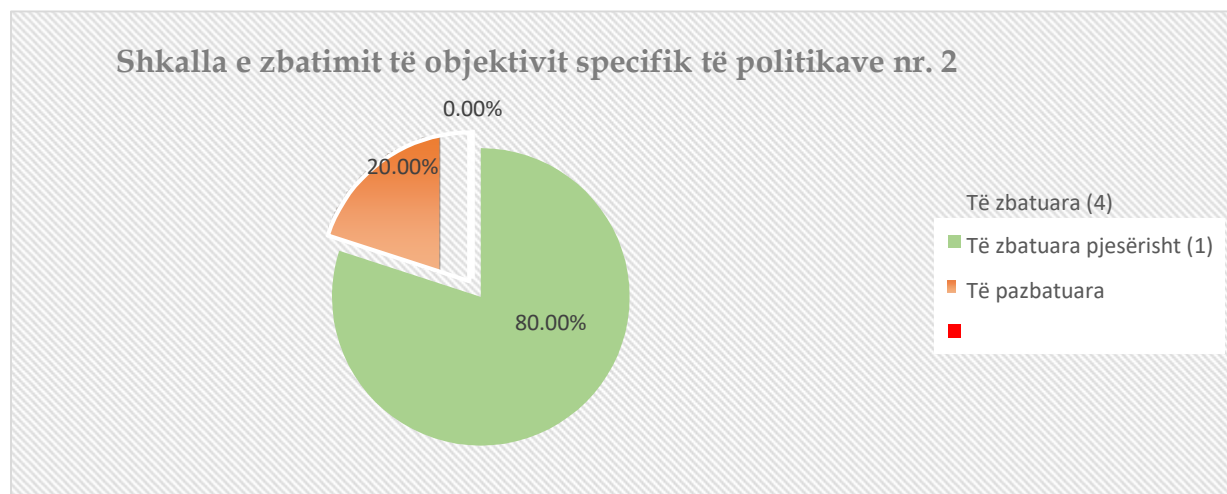

Ky objektivi përmban gjithsej 3 aktivitete dhe 15 tregues të planifikuar për zbatim deri në fund të vitit 2021. 5 nga 15 treguesit janë planifikuar për vitin 2019. 4 nga treguesit e planifikuar janë zbatuar plotësisht gjatë periudhës janar-dhjetor 2019.

Zyra për Qeverisje të Mirë po vazhdon të monitorojë përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Mbështetjes Buxhetore sipas IPA 2, duke marrë parasysh respektimin e vazhdueshëm të Rregullores nr. 05/2016 mbi Standardet Minimale për Konsultime Publike. Për zbatimin e treguesit 2 lidhur me "Komunikimin efikas publik, konsultimin publik dhe pjesëmarrjen e palëve të interesuara" gjatë vitit 2018, 50% e dokumenteve që janë në platformën e konsultimit publik duhet të jenë në përputhje me rregulloren. Pra, nga 82 dokumente që ishin objekt i konsultimit publik në platformën online, 48 dokumente ose 59 për qind e tyre plotësuan standardet e konsultimit publik. Për vitin 2019, institucionet janë të detyruara të përmbushin standardet minimale prej 65 për qind të dokumenteve në platformën e konsultimit.

2.3 Objektivi specifik 3: Përmirësimi i planit të punës



Ky objektiv përmban 1 aktivitet dhe 10 tregues të planifikuar për zbatim deri në fund të vitit 2021. 4 nga 10 treguesit janë planifikuar për vitin 2019, dhe vetëm njëri prej këtyre treguesve është zbatuar plotësisht.

Gjatë vitit 2019, SKQ-ja ka hartuar dhe miratuar Udhëzuesin dhe Manualin e ri mbi Planin Indikativ Shumëvjeçar të Punës, për periudhën 2020-2022. Në këtë drejtim, ministritë e linjës janë informuar lidhur me strukturën e re. Megjithatë, miratimi i planit të ri është vonuar për shkak të pritjes për Programin Qeveritar të Qeverisë së re.

Sfidat dhe hapat e ardhshëm

Objektivi i përgjithshëm 1: Sistemi rregullativ i favorshëm

Ekzistojnë disa sfida që duhet të adresohen në periudhën e ardhshme për t'i kapërcyer pengesat ekzistuese dhe për të rritur mundësinë e zbatimit të treguesve. Sa i përket objektivit të parë të përgjithshëm, rekrutimi i stafit përkatës për qëllime të zvogëlimit të barrës administrative (10 zyrtarë nga skema e profesionistëve të rinj) ka ndihmuar SKQ-në të përfundojë koncept dokumentin mbi zvogëlimin e barrës administrative i cili, për shkak të problemeve të mungesës së qeverisë, u shty dhe u miratua në mbledhjen e qeverisë në shkurt 2020. Tani sfida është të arrihet caku prej 10% për thjeshtësimin, revokimin ose zvogëlimin e licencave dhe lejeve, që është nën përgjegjësinë e Zyrës Ligjore në ZKM. SKQ-ja do të sigurojë që të vazhdojë bashkëpunimin dhe mbështetjen e nevojshme në këtë proces për të arritur cakun e caktuar. Sfida tjetër sipas këtij objekti të përgjithshëm ka të bëjë me përditësimin e Rregullores së Punës së Qeverisë. Për shkak të arsyeve të ndryshme të koordinimit, përfundimi i draftit u shty për vitin 2020, edhe pse synimi fillestar ishte të miratohet deri në dhjetor 2019. Në këtë drejtim, SKQ-ja do vazhdojë bashkëpunimin e saj me Zyrën e Planifikimit Strategjik, dhe do të caktojë caqe të qarta me mbështetjen e SIGMA-s, në mënyrë që të përfundojë draftin e ri. Së fundi, është e nevojshme të përmendet që vlerësimi ex-post i legjislacionit nuk është aq i institucionalizuar sa vlerësimi i tanishëm ex-ante. Tutje, është e nevojshme që Zyra Ligjore të përcaktojë ocaqe të qarta pasi që trajnerët e parë për vlerësimin ex-post janë certifikuar në fillim të vitit 2020, dhe të fillojë me trajnime të menjëhershme me nëpunës civilë përkatës në ministritë e linjës të cilat do të jenë në gjendje të kryejnë vlerësime ex-post.

Objektivi i përgjithshëm 2: Komunikimi efikas publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara

Objektivi i dytë i përgjithshëm i Strategjisë ka treguar një pamje shumë të suksesshme në arritjet e përgjithshme, megjithatë ekziston ende një aspekt i rëndësishëm që duhet të kontrollohet vazhdimisht për përmirësime. Ai është ngritja e kapaciteteve për zyrën e komunikimit në zyrën e kryeministrit në mënyrë që të jenë në gjendje t'i trajnojnë dhe t'i mbështesin të gjitha zyrat përkatëse të komunikimit në ministritë e linjës për angazhimin e palëve të interesuara dhe komunikimin e duhur të politikave. Gjithashtu, është e nevojshme përmendet se organizimi i takimeve publike me palët e interesuara gjatë hartimit të koncept dokumenteve u mbështet

financiarisht kryesisht nga projekti SIDA në ZKM, mandati i të cilit do përfundojë në fund të vitit 2020, dhe në këtë aspekt është e rëndësishme që SKQ-ja, së bashku me ZKP-në, të fillojnë hartimin e një plani të qëndrueshëm për organizimin e takimeve publike dhe të rritin angazhimin e palëve të interesuara në procesin e politikëbërjes.

Shtojca

Tabela 2: Karta raportuese për zbatimin e veprimeve për reformën (2019)

ZBATIMI I KARTËS RAPORTUESE TË VEPRIMEVE PËR REFORMËN					
<u>Objektivi i përgjithshëm 1:</u>		<u>Sistemi rregullativ i favorshëm</u>			
Objektivi specifik 1.1		Reformat e legjislacionit ekzistues primar dhe sekondar për të rritur konkurrueshmërinë			
Nr.	Aktivitetet	Statusi	Institucioni përgjegjës ¹	Shpjegim i shkurtë i progresit	Produkti final i aktivitetit
1.1.1	Miratimi i koncept dokumentit për Zvogëlimin e Barrës Administrative	Pjesërisht i zbatuar	Sekretariati Koordinues i Qeverisë	Koncept dokumenti ka kaluar të gjithë hapat e nevojshëm për t'u miratuar, megjithatë, për shkak të qeverisë në ikje nuk është vënë në agjendë.	Koncept dokumenti i miratuar ²
1.1.2	Integrimi i MKS-së në zhvillimin e politikave	Pjesërisht i zbatuar	Sekretariati Koordinues i Qeverisë	14 trajnerë janë certifikuar për MKS-në dhe 6 trajnime janë mbajtur me ministritë e linjës në këtë drejtim. Megjithatë, 305 llogaritje të MKS-së të koncept dokumenteve ekzistuese janë shlyrë për vitin 2020.	14 trajnerë të certifikuar

¹ Nuk ka institucione përkatëse, vetëm zyra dhe agjenci përkatëse në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Kosovës për zbatimin e Strategjisë së Rregullimit më të Mirë 2.0

² Për shkak të formimit të vonshëm të Qeverisë, Koncept Dokumenti është miratuar dhe publikuar në shkurt të vitit 2020

1.1.3	Thjeshtësimi, bashkimi ose revokimi i 10% të licencave dhe lejeve	I zbatuar	Zyra Ligjore	Raportet e përfunduara nga KNF/Banka Botërore në bashkëpunim me ministrinë e linjës janë bashkëngjitur në shtojcën 16 të Koncept Dokumentit për Programin e Zvogëlimit të Barrës Administrative dhe janë publikuar në Konsultimet Publike. Gjithashtu, projektligjet dhe aktet nënligjore të identifikuar në raportet e thjeshtësimit do të jenë pjesë e programit legjislativ për vitin 2020, si dhe pjesë e planit të akteve nënligjore për vitin 2020.	Raporti i finalizuar ³
-------	---	-----------	--------------	---	-----------------------------------

Objektivi specifik 1.2

Zbatimi i vlerësimit të ndikimit

Nr.	Aktivitetet	Statusi	Institucioni përgjegjës	Shpjegim i shkurtër i progresit	Produkti final i aktivitetit
1.2.1	Trajnimi i stafit përkatës për zhvillimin e politikave dhe vlerësimin ndikimit	I zbatuar	Sekretariati Koordinues i Qeverisë	Nga 545 anëtarë të stafit përkatës, 509 prej tyre janë trajnuar në trajnime 3-ditore, kështu duke tejkaluar cakun prej 50% për vitin 2019.	509 nëpunës civilë të trajnuar
1.2.2	Zbatimi i vlerësimit të ndikimit gjinor	Pjesërisht i zbatuar	Agjencia për Barazi Gjinore	ABGJ-ja organizoi vetëm 5 trajnime ndërsa 9 trajnime ishin planifikuar për vitin 2019 mbi Vlerësimin e Ndikimit Gjinor	5 trajnime të mbajtura

³ Bazuar në Kontratën për Mbështetje Buxhetore Sektoriale, produkti i vitit 2019 është përfundimi i analizës për thjeshtësimin e licencave dhe lejeve. 10% e thjeshtësimit do të zbatohet deri në fund të vitit 2020

				gjatë muajit prill dhe qershor dhe u komentuan gjithsej tetë koncepte dokumente, ku numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve ishte 94, prej të cilëve 62 ishin gra dhe 32 burra, dhe përfshirë stafin e ABGJ-së, gjithsej 130 pjesëmarrës.	
1.2.3	Përditësimi i Rregullores së Punës	I pazbatuar	Zyra Ligjore, Sekretariati Koordinues i Qeverisë	RRP-ja e përditësuar supozohej të miratohej deri në fund të vitit 2019, megjithatë procesi është shtyrë për vitin 2020.	Nuk ka produkt
1.2.4	Koordinimi dhe zbatimi i MM-së për bashkëpunim me Shqipërinë në fushën e Rregullimit më të Mirë	Pjesërisht i zbatuar	Sekretariati Koordinues i Qeverisë	Nga 4 takime të planifikuara, 3 prej tyre janë organizuar.	Tri takime të organizuara

Objektivi specifik 1.3

Përmirësimi i të dhënave/statistikave mbi hartimin e politikave

Nr.	Aktivitetet	Statusi	Institucioni përgjegjës	Shpjegim i shkurtër i progresit	Produkti final i aktivitetit
1.3.1	Zhvillimi i bazës së të dhënave për VN-në	I zbatuar	Sekretariati Koordinues i Qeverisë	Është miratuar baza e të dhënave për VN-në dhe do të publikohet në uebfaqen e ZKM-së	Baza e të dhënave e VN-së e krijuar

Objektivi specifik 1.4

Vlerësimi

Nr.	Aktivitetet	Statusi	Institucioni përgjegjës	Shpjegim i shkurtër i progresit	Produkti final i aktivitetit
1.4.1	Pilot vlerësimet	Pjesërisht i zbatuar	Zyra Ligjore	Nga 5 vlerësime ex-post të planifikuara, 4 prej tyre janë	4 vlerësime ex-post të përfunduara

				realizuar.	
1.4.2	Ngritja e kapaciteteve trajnuese për Vlerësim	Pjesërisht i zbatuar	Zyra Ligjore	Nga 2 trajnime të planifikuara për vitin 2019, 1 është mbajtur.	1 trajnim i mbajtur
1.4.3	Është përcaktuar procesi i përdorimit të konstatimeve nga vlerësimi për të përmirësuar legjislacionin ekzistues	I pazbatuar	Zyra Ligjore	Manuali për vlerësimin ex-post është në fazën përfundimtare të hartimit dhe pritet të finalizohet në vitin 2020.	Nuk ka produkt
<u>Objekti i përgjithshëm 2:</u>		<u>Komunikimi efikas publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara</u>			
<u>Objekti specifik 2.1:</u>		Përmirësimi i komunikimit të politikave			
Nr.	Aktivitetet	Statusi	Institucioni përgjegjës	Shpjegim i shkurtër i progresit	Produkti final i aktivitetit
2.1.1	Komunikimi i politikave përmirësuar	I zbatuar	Zyra për Komunikim me Publikun	Plani Vjetor i Komunikimit është hartuar për të mbështetur komunikimin e aktiviteteve prioritare të pasqyruara në PVPQ për vitin 2019. Gjithashtu, ZKP ka përfunduar të gjitha trajnimet e planifikuara për ministritë e linjës për komunikimin e politikave.	Plani i veprimit i hartuar
2.1.2	Ngritja e kapaciteteve trajnuese për komunikimin e politikave	I zbatuar	Zyra për Komunikim me Publikun	Janë organizuar 5 trajnime për Qendrën e Qeverisë. Trajnimet janë integruar në 5, pasi 3 prej tyre kanë qenë më gjithëpërfshirëse për sa i përket	5 trajnime të mbajtura

				numrit të stafit të trajnuar dhe temave të mbuluara.	
Objektivi specifik 2.2: Përmirësimi i konsultimeve					
Nr.	Aktivitetet	Statusi	Institucioni përgjegjës	Shpjegim i shkurtë i progresit	Produkti final i aktivitetit
2.2.1	Rritja e kapaciteteve të stafit për konsultime	Pjesërisht i zbatuar	Zyra për Qeverisje të Mirë	Nga 6 aktivitete të planifikuara, vetëm 3 janë mbajtur gjatë vitit 2019.	3 trajnime të mbajtura
2.2.2	Niveli i përputhshmërisë me standardet minimale për të gjitha vendimet përkatëse të qeverisë	I zbatuar	Zyra për Qeverisje të Mirë	Zyra për Qeverisje të Mirë ka mbajtur takime për koordinatorët e konsultimit me: MZHE-në, MKRS-në, MTI-në, MI-në, MSH-në dhe MDIS-në.	6 takime të mbajtura
2.2.3	Raporti për zbatimin dhe nivelin e përputhshmërisë me standardet minimale për konsultim	I zbatuar	Zyra për Qeverisje të Mirë	Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, me qëllim të zbatimit të Rregullores për Standardet Minimale të Procesit të Konsultimeve Publike, ka përgatitur dhe publikuar Raportin Vjetor për Rezultatet e Konsultimeve Publike për vitin 2018 bazuar në rregullore, në mars të vitit 2019.	Raporti i publikuar
Objektivi specifik 2.3: Përmirësimi i planit të punës së Qeverisë					
Nr.	Aktivitetet	Statusi	Institucioni përgjegjës	Shpjegim i shkurtë i progresit	Produkti final i aktivitetit
2.3.1	Zhvillimi i PISHP-së (Planit Indikativ	Pjesërisht i zbatuar	Sekretariati Koordinues i Qeverisë	Koncept dokumenti për PISHP-në është miratuar dhe SKQ-ja	Nuk ka produkt

	Shumëvjeçar të Punës)			ka përfunduar Udhëzuesin dhe Manualin për hartimin e PISHP-së i cili është ndarë me ministritë e linjës. Për shkak të vonesave në Programin Qeveritar për vitin 2020, nuk ka qenë e mundur që PISHP-ja të miratohet.	
--	-----------------------	--	--	--	--
